

Viikkotiedote

viikko 7

31.1-4.2.2022

Työmaan vahvuus

10

Työvaiheet:

Liikuntasalin alakattotyöt jatkuu

Yläkerran laattatyöt ja vesieristykset valmiit

Liikuntasalin lattioiden ummistus aloitettu

Akryylityöt aloitettu, wc- ja suihkukopit valmiit, pukuhuoneet viikolla 8


Maalaustyöt yläkerrassa jatkuu



Valmis akryylipinta märkätilassa



Liikuntasalin lattian ummistus vanhoja lattiaanaloja käyttäen

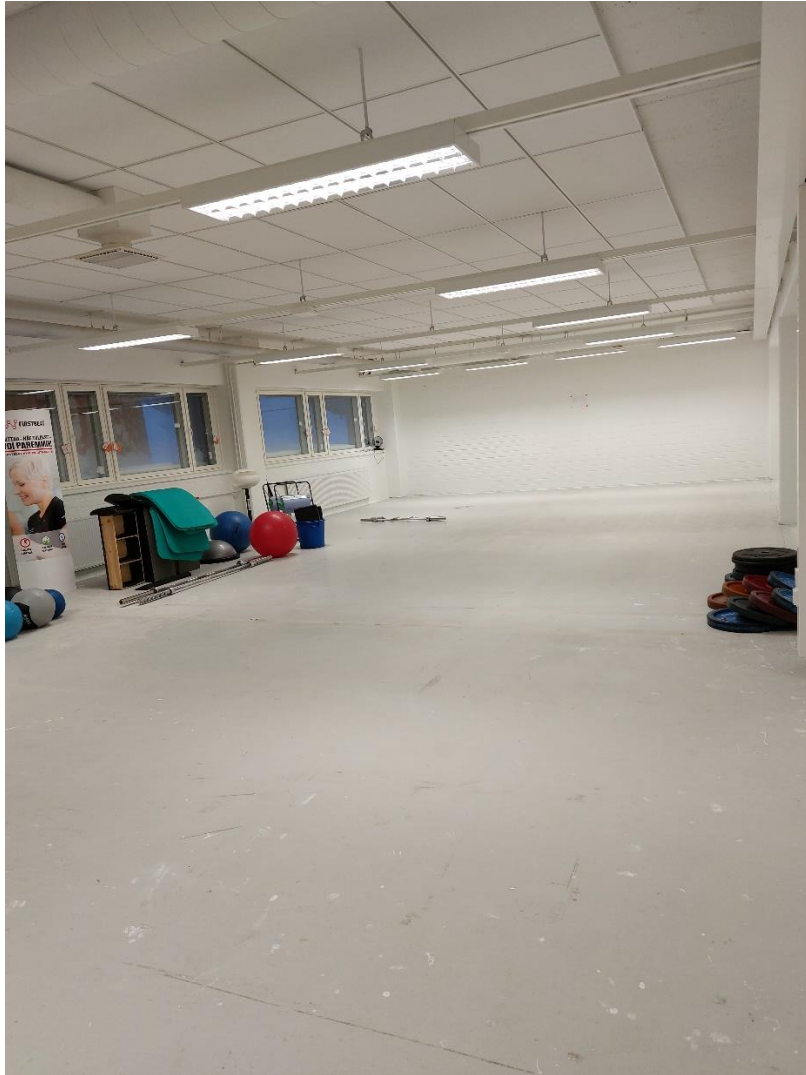

Kuntosali muuttaa tiloihin 005 ja 006 18.2.2022.

**Tulevat työvaiheet: (viikolla 8-9)**

- Akryylilattiat valmiiksi
- Yläkerran alakattotyöt
- Kuntosalin saneeraus
- Mattopohjien teko
- Lattialaatoituksen ja luiskien teko kuntosalin käytävään
