

Viikkotiedote
Työmaan vahvuus

viikko 12
11

21.3-25.3.2022

Työvaiheet:

Kuntosalin ja kellarikerroksen alakattotyöt


Kuntosalin ja tanssisalin lattiauiskien laatoitukset.

WC tilojen varustelu


Maalaustyöt yläkerrassa



Wc tilojen varustelut on liikkeellä

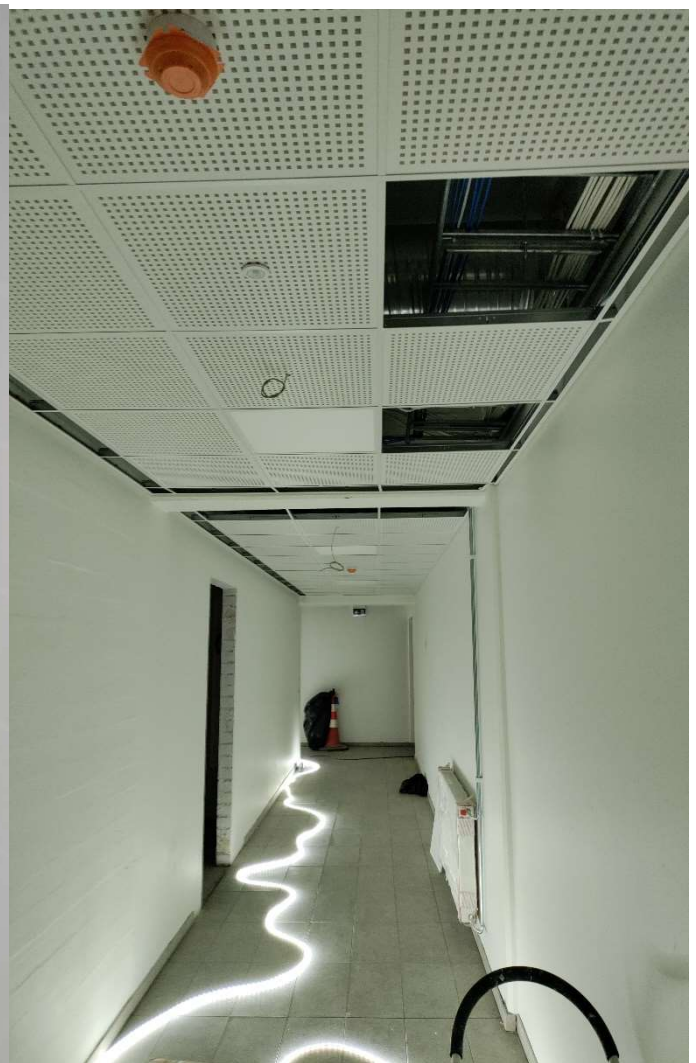

Pohjakerroksen alakattotyöt

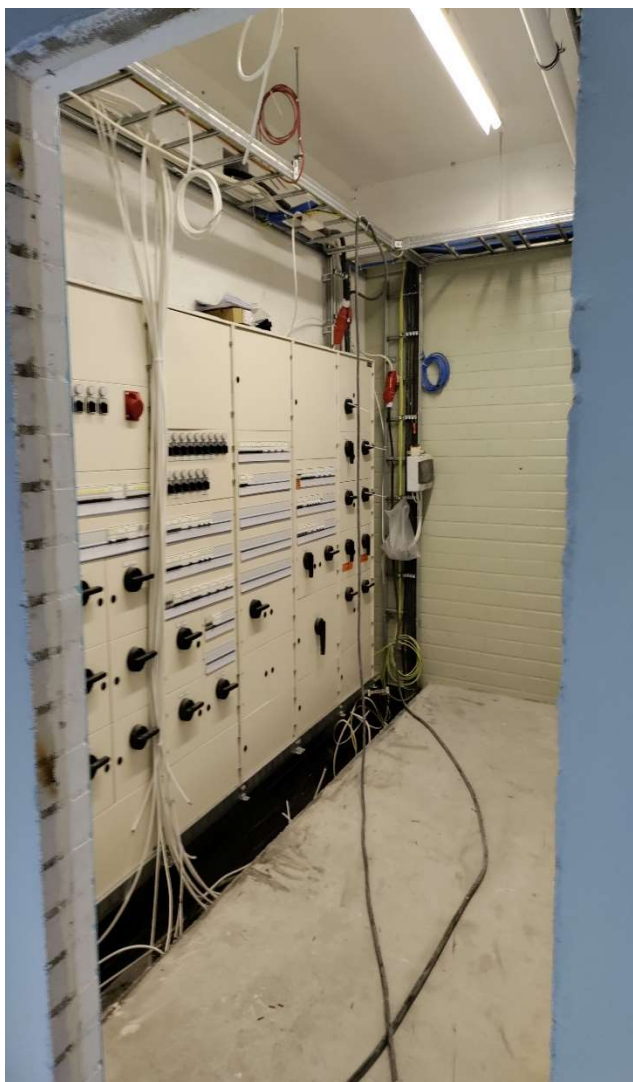

Sähköpääkeskus on vaihdettu



Yläkerrasta ensimmäinen huone laatassa

Tulevat työvaiheet: (viikolla 13-14)

- Väliovien asennukset
- Yläkerran alakattotyöt
- 1 krs aulan ja porrastasojen lattia laatoitukset.
- Kuntosalin loppusiivous ja luovutus yrittäjälle
- Varusteiden asentaminen
